



Lima
2019
PANAMERICANOS



LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARA PANAMERICANOS 2019, MARCO LEGAL ESPECIAL IMPACTO EN LA EJECUCIÓN

Mag. Ing. Rubén Gómez Sánchez S.
Responsable de la Oficina de Proyecto PEJP
Lima, 13 de julio de 2017



Marco Legal Especial PEJP DL 1248 y 1335

Crear un marco normativo especial para agilizar sus procesos de inversión y otras actividades

Suscribir convenios de administración de recursos con organismos internacionales, así como sus respectivas adendas, para la adquisición de B y S

Emplear la modalidad de contratación de Estado a Estado para la contratación de gestión y para la provisión de todas las prestaciones necesarias

Suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno 18/04/17



Suscripción del Acuerdo de Gobierno a Gobierno 18/04/17



ID	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	P	tri 1, 2017		tri 3, 2017		tri 1, 2018		tri 3, 2018		tri 1, 2019		tri 3, 2019	
						ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct	ene	abr	jul	oct
0	0	[-] CRONOGRAMA GENERAL PRELIMINAR DEL PEJP LIMA 2019	lun 03/04/17	lun 01/04/19													
1	1	[-] PROGRAMA DE VENEUS DEL PEJP LIMA 2019	lun 03/04/17	lun 01/04/19													
2	1.1	[-] VILLA PANAMERICANA	lun 03/04/17	lun 01/04/19													
3	1.1.1	INIICIO VILLA PANAMERICANA	lun 03/04/17	lun 03/04/17													
4	1.1.2	[+] EXPEDIENTE DE INGENIERÍA	lun 03/04/17	mié 21/06/17													
7	1.1.3	[+] MOVIMIENTO DE TIERRAS	vie 07/07/17	jue 05/10/17													
9	1.1.4	[+] PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA	vie 23/06/17	jue 31/08/17													
11	1.1.5	[+] DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	lun 04/09/17	lun 01/04/19													
17	1.1.6	FIN VILLA PANAMERICANA	lun 01/04/19	lun 01/04/19	1												

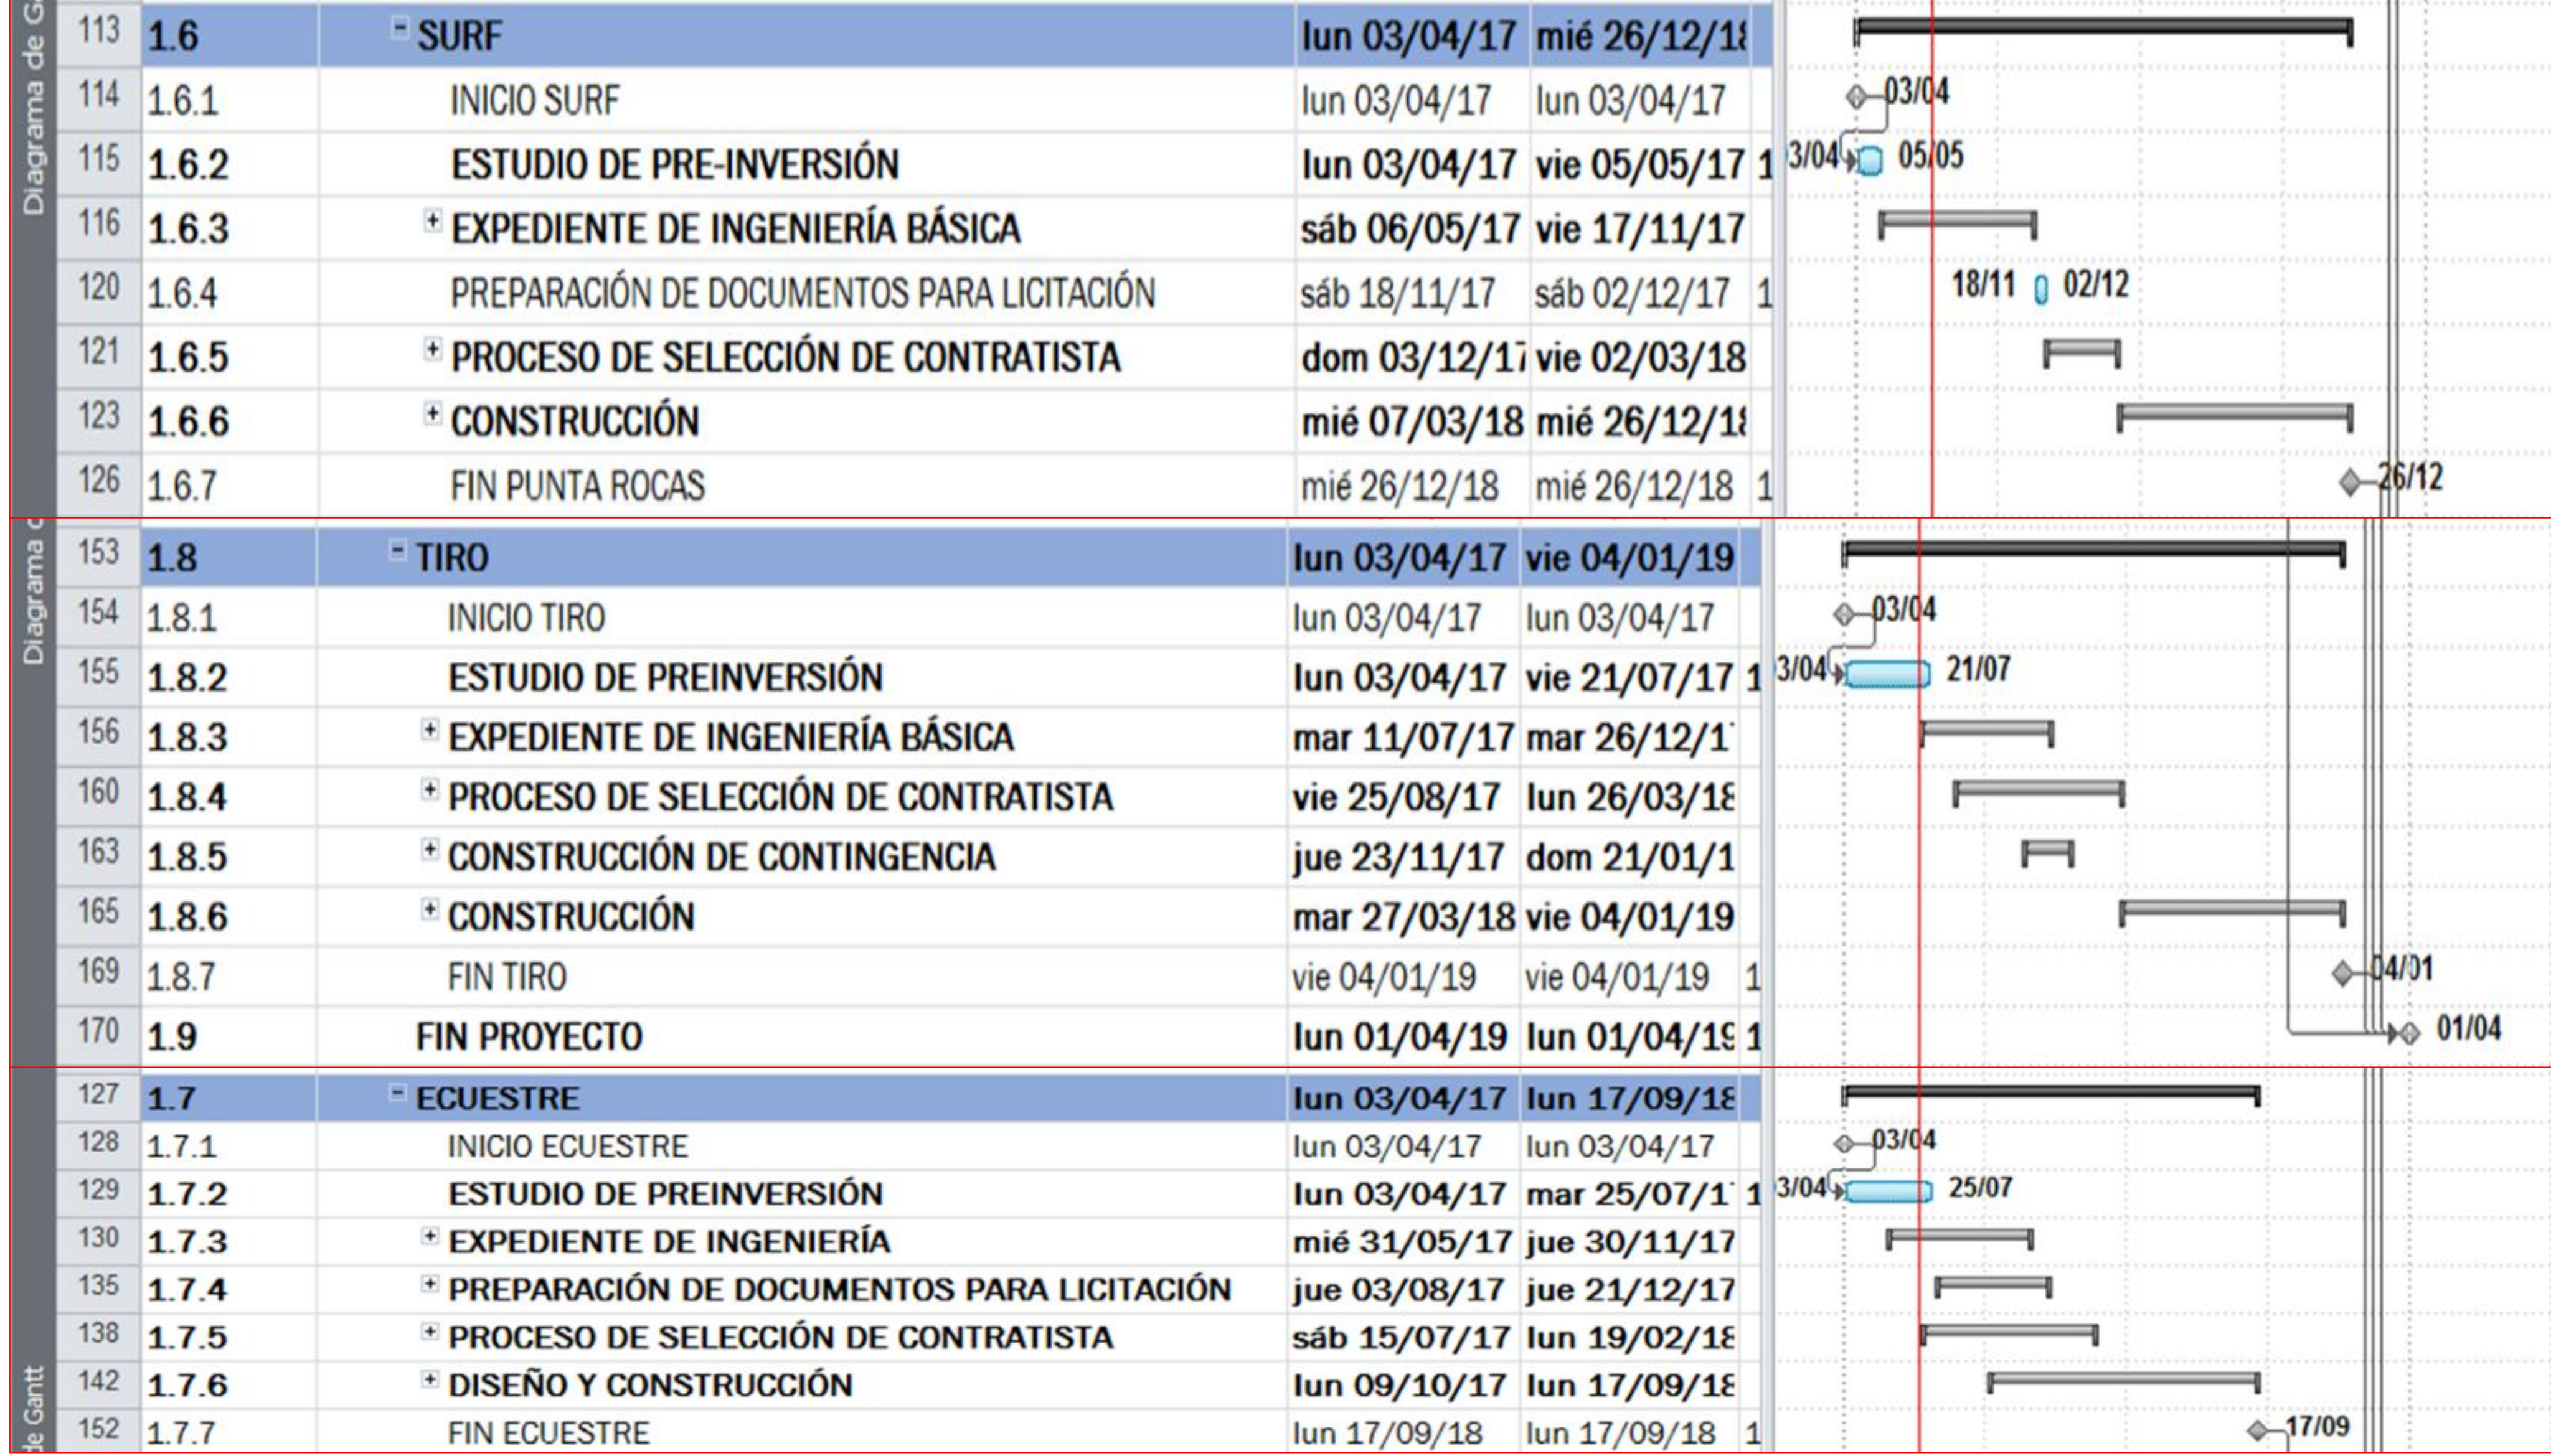




Diagrama de Gantt						
18	1.2	VIDENA	lun 03/04/17	vie 25/01/19		
19	1.2.1	INICIO VIDENA	lun 03/04/17	lun 03/04/17		03/04
20	1.2.2	EXPEDIENTE DE INGENIERÍA	lun 03/04/17	sáb 15/07/17		
23	1.2.3	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA (ESTRATEGIA 1)	dom 16/07/17	lun 13/11/17		
26	1.2.4	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (ESTRATEGIA 1)	vie 17/11/17	vie 07/12/18		
35	1.2.5	FIN (ESTRATEGIA 1)	vie 07/12/18	vie 07/12/18	2	07/12
36	1.2.6	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA (ESTRATEGIA 2)	dom 16/07/17	vie 13/10/17		
39	1.2.7	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (ESTRATEGIA 2)	mar 17/10/17	vie 25/01/19		
47	1.2.8	FIN (ESTRATEGIA 2)	vie 25/01/19	vie 25/01/19	4	25/01
48	1.2.9	FIN VIDENA	vie 25/01/19	vie 25/01/19	3	25/01
Diagrama de Gantt						
74	1.4	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	lun 03/04/17	vie 22/02/19		
75	1.4.1	INICIO VILLA MARIA DEL TRIUNFO	lun 03/04/17	lun 03/04/17		03/04
76	1.4.2	EXPEDIENTE INGENIERÍA BÁSICA	lun 03/04/17	vie 27/10/17		
80	1.4.3	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN	jue 06/07/17	jue 20/07/17	7	06/07 20/07
81	1.4.4	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA	sáb 15/07/17	jue 23/11/17		
84	1.4.5	MOVIMIENTO DE TIERRAS	vie 24/11/17	lun 22/01/18		
86	1.4.6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	dom 24/12/17	vie 22/02/19		
91	1.4.7	EQUIPAMIENTO (ADELANTO)	vie 01/12/17	vie 01/12/17	8	01/12
92	1.4.8	FIN VILLA MARIA DEL TRIUNFO	vie 22/02/19	vie 22/02/19	8	22/02

49	1.3	CALLAO	lun 03/04/17	vie 25/01/19	
50	1.3.1	INICIO CALLAO	lun 03/04/17	lun 03/04/17	
51	1.3.2	EXPEDIENTE INGENIERÍA	lun 03/04/17	sáb 15/07/17	
55	1.3.3	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA (ESTRATEGIA 1)	dom 16/07/17	sáb 14/10/17	
58	1.3.4	CONSTRUCCIÓN DE CONTINGENCIA (ESTRATEGIA 1)	mié 18/10/17	jue 30/11/17	
60	1.3.5	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	mié 18/10/17	jue 30/11/17	
62	1.3.6	FIN CONTINGENCIA (ESTRATEGIA 1)	jue 30/11/17	jue 30/11/17	5
63	1.3.7	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA (ESTRATEGIA 2)	dom 16/07/17	lun 13/11/17	
66	1.3.8	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	vie 17/11/17	vie 25/01/19	
72	1.3.9	FIN YAHUARHUACA (ESTRATEGIA 2)	vie 25/01/19	vie 25/01/19	6
73	1.3.10	FIN CALLAO	vie 25/01/19	vie 25/01/19	6

93	1.5	SAN ISIDRO - SAN JUAN	lun 03/04/17	sáb 05/01/19	
94	1.5.1	INICIO SAN JUAN	lun 03/04/17	lun 03/04/17	
95	1.5.2	EXPEDIENTE INGENIERÍA (VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD)	lun 03/04/17	lun 31/07/17	
99	1.5.3	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA	dom 16/07/17	mié 29/11/17	
103	1.5.4	CONSTRUCCIÓN DE CONTINGENCIA	jue 30/11/17	mar 09/01/19	
105	1.5.5	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	jue 30/11/17	sáb 05/01/19	
111	1.5.6	EQUIPAMIENTO (ADELANTO)	lun 02/10/17	lun 02/10/17	9
112	1.5.7	FIN SAN JUAN	sáb 05/01/19	sáb 05/01/19	1







www.lima2019.pe



[/lima2019juegos](https://www.facebook.com/lima2019juegos)



[@Lima2019Games](https://twitter.com/Lima2019Games)



[lima2019juegos](https://www.instagram.com/lima2019juegos)



[Lima 2019 juegos](https://www.youtube.com/Lima2019juegos)
